



Travaux en cours : Des nouvelles du projet d'assainissement de Goose Bay

Institut des biens immobiliers du Canada
Atelier national de 2012 sur les sites contaminés fédéraux

Le mardi 1^{er} mai
Centre Allstream, Toronto, Ontario



Points à aborder

1. Vue d'ensemble du projet
2. Où nous étions
3. Ce que nous avons accompli
4. Où nous allons






Vue d'ensemble du projet






Vue d'ensemble du projet

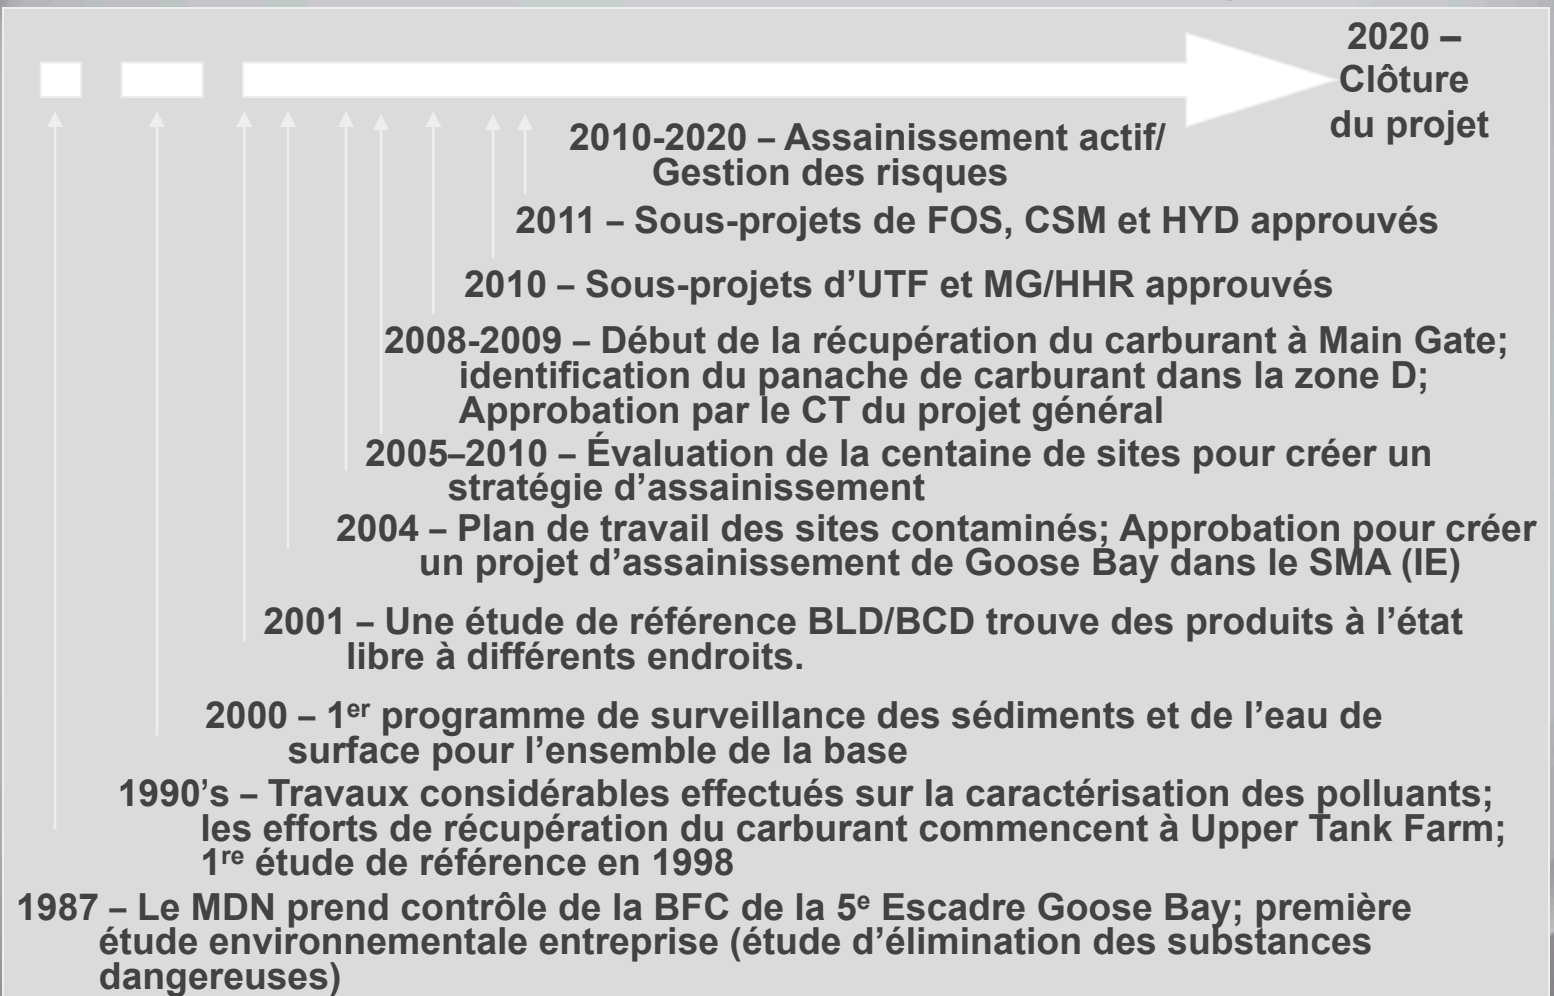



Vue d'ensemble du projet

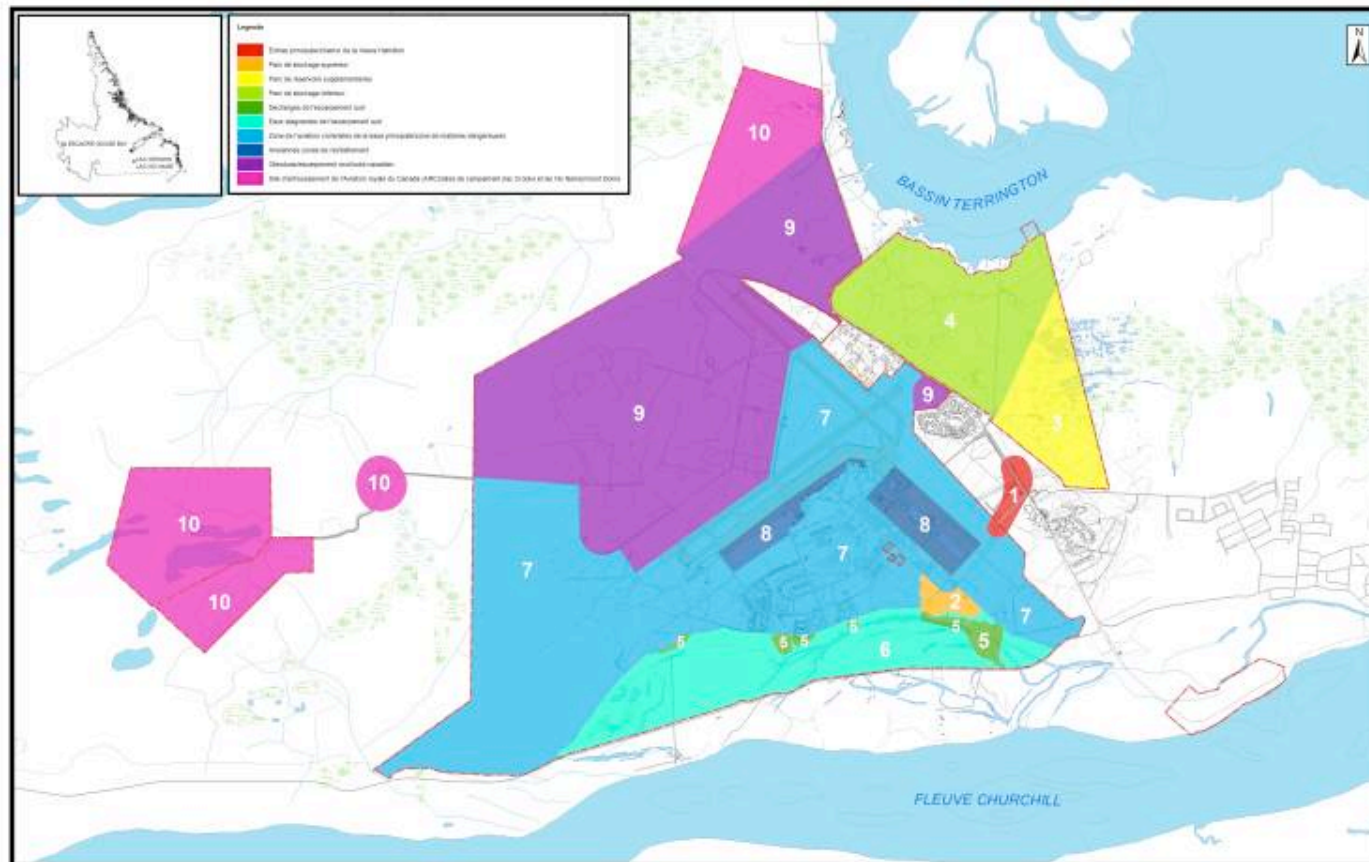



Où nous étions





Où nous étions

- Plus de 5 années passées à évaluer plus de 100 sites individuels
- Développement de critères d'évaluation appropriés
- Création d'une EE complète de niveau de sélection
- Approbation par le CT du projet jusqu'en 2020
- Début de la récupération du carburant sur 3 sites
- Retrait de plus de 500 fûts du site
- Dialogue continu avec des experts et d'autres intervenants
- Détermination des points finaux d'assainissement





Ce que nous avons appris

- 1. Le processus à 10 étapes n'est pas linéaire**
- 2. La participation précoce des parties concernées**
- 3. Il faut définir clairement les rôles et les responsabilités**
- 4. Le risque pose un défi**
- 5. L'incertitude pose un défi plus grand que le risque**
- 6. La complaisance est un risque silencieuse**
- 7. Le changement a du bon... l'innovation est du mieux**
- 8. Planifiez l'approvisionnement très tôt**
- 9. Un optimisme injustifié abonde**
- 10. Une campagne de promotion est important**



Où nous allons

Sous-Projet		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	EP / CRH	█											
2.	PSS		█										
3.	PRS			█									
4.	PSL					█							
5.	DES				█								
6.	ESES					█							
7.	ZAC / SBP / ZMD					█							
8.	AZR			█									
9.	OD / EN / SCC				█								
10.	SEARC / SC / MD			█									



Où nous allons

- Les trois prochaines années seront encore les plus occupées.
- Huit des 10 sous-projets approuvés d'ici à l'été et en cours de mise en œuvre ou prêt à l'être
- Les deux derniers sous-projets devraient être approuvés en 2013.
- Un nombre important de contrats en cours ou nouveaux pour :
 - Récupération du carburant
 - Assainissement du sol
 - Analyse des risques
 - Recouvrement et confinement
 - Surveillance
- Nous continuons de chercher partout des gains de rendement





Questions / Commentaires

Craig Wells
D Gest GE 8
Gestionnaire de projet



613-943-7835

craig.wells2@forces.gc.ca
